



Grundlagen des Projektmanagements

Projektinitialisierung



Themenübersicht

01

Basiswissen

- Projekt
- Projektmanagement
- Projektarten und –Kriterien
- Projektphasen
- Vorgehensmodelle

02

Basiswissen

- Analyse / Synthese
- Teamaufbau
- Projektleiter
- Projektorganisationen

03

Projektinitialisierung

- Projektidee
- Das Lastenheft
- Zieldefinition
- Stakeholder-und Risikoanalyse
- Kick-Off-Meeting
- Das Pflichtenheft
- Projektantrag / -auftrag

04

Projektplanung

- Projektstrukturplan
- Vorgangsliste
- Gantt-Diagramme
- Netzplantechnik

05

Projektplanung

- **Das magische Dreieck**
- Ressourcenplanung
- Kostenplanung
- Finanzplanung



Themenübersicht

06

Projekt-durchführung

- Projektcontrolling
- Projektsteuerungszyklus
- Termin-, Kosten- und Leistungskontrolle
- Projektdokumentation und Berichte

07

Projektabschluss

- Abnahme
- Abschlusssitzung „Lessons learned“
- Archivierung
- Auflösung Projektorganisation
- Abschlussfeier

08

Scrum

- Klassisch vs. Agil
- Scrum?
- Meetings
- Sprint
- Team
- Artefakte

09

Übungstag

- Zusammenfassung
- Vorbereitung Bausteinprüfung
- Zeit zum Üben

10

Bausteinprüfung

- Trainerbewertung
- Vorbereitung
- Bausteinprüfung
- Nachbesprechung



02 Projektinitialisierung

Jetzt geht es los. Der Grundstein wird gelegt.



Nullphase

Was ist das nochmal?

- der Projektstartphase vorgelagert (siehe Projektphasen Grundbegriffe – freie Aufteilungsoption)
- Inhaltlich – Projektideenfindung und Prüfung der Umsetzbarkeit oder auch Bedarfsanalyse mit Auftraggeber und Auftragnehmer in Zusammenarbeit
- Sondierung der Machbarkeit und Anforderungsrealisierung

Am Anfang ist das...



Projektidee

Am Anfang steht

- Brainstorming - Ideensammlung
- Mindmapping – Clustern und Rahmenparameter definieren
- Projektumfeldanalyse (PUMA) – 7 W-Frage
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit





Die Puma-Analyse

PUMA-Analyse

Definition

- Ziele einer **Projektumfeldanalyse** sind: Erkennung und Erfassung aller Randbedingungen und Einflussfaktoren für das Projekt. Erfassung aller Interessensgruppen am Projekt (Stakeholder) und der Art ihrer Interessen. Identifizierung von Projektrisiken (sowohl Bedrohungen als auch Chancen)

PUMA-Analyse

Erklärung

- PUMA = Projektumfeldanalyse
- Bewertung der Faktoren für Projektumsetzung: sozial, sachlich, zeitlich und ethisch
- Erste Datensammlung, die dann später für weitere Analysen genutzt wird – siehe Stakeholder- und Risikoanalyse

PUMA-Analyse

Beispiel





Das Lastenheft

Das Lastenheft

Ausgangssituation und Wünsche des Kunden

- Ersteller: **Auftraggeber**
- Gemäß DIN 69901-5[1] (Begriffe der Projektabwicklung) beschreibt das Lastenheft die "vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines Auftrages". Im Rahmen eines Werkvertrages oder Werkliefervertrages und der dazugehörigen formellen Abnahme beschreibt das Lastenheft präzise die nachprüfbaren Leistungen und Lieferungen.


https://de.wikipedia.org/wiki/Lastenheft#Normen_und_Standards

Das Lastenheft	
Ist-Analyse	Soll-Analyse
• vorhandene Geschäftsprozesse und Abläufe	• Muss-Kriterien (Must)
• Status Quo	• Kann-Kriterien (Could)
• Ausgangssituation	• Sollte-Kriterien (Should)
• Bestandsaufnahme	• Kunden-Bedarf
• Unternehmensstruktur	• Ausschlusskriterien
Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit	

Lastenheft – Wo gehört es im Projekt hin?

In kleinen und mittelständigen Unternehmen gibt es oft Bedarf aber die konkrete Darstellung fehlt

- Je früher desto besser
- Arbeitsgrundlage
- notwendig für Projektauftrag
- Fundament eines Projektes
- Basis für die Erstellung des Pflichtenheftes

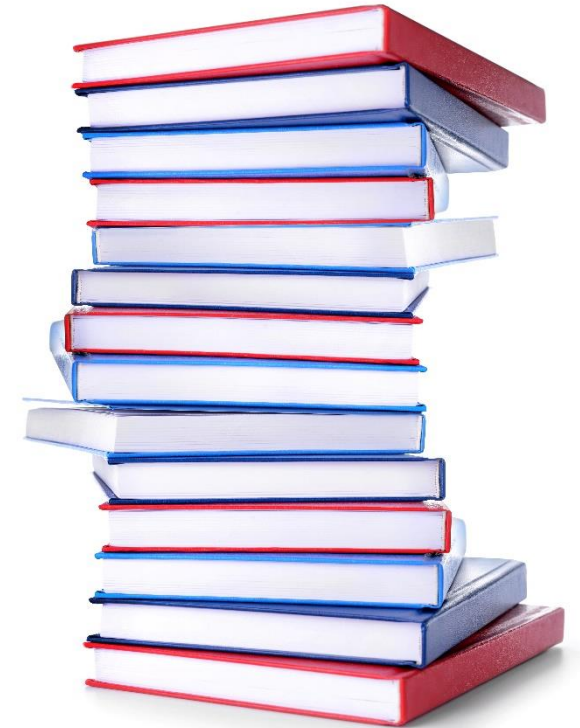

Kein Lastenheft vorhanden

Zeigen wie es geht – die Extra-Meile des Projektleiters

- **Gemeinsame Ist- und Soll-Analyse**
 - Projektleiter lernt Unternehmen und Abläufe durch Beobachtung kennen
 - Workshops
 - **Methoden der Ist-Analyse:** Interviews, Dokumentationen sichten, Fragebögen, Beobachtungen
 - **Methoden der Soll-Analyse:** mit den 7 W-Fragen gewünschte Ergebnisse und Vorstellungen erfassen und veranschaulichen unter Beachtung Muss-, Sollte-, Kann-und Ausschluss-Kriterien





Die 7 W-Fragen

Die 7 W-Fragen

Macht das Projekt Sinn?




Wirtschaftlich?



Wirtschaftlichkeitsprinzip

Macht es überhaupt Sinn, das Projekt umzusetzen?

- Durchführbarkeits- oder Machbarkeitsstudie
- Nutzwert-Analyse
- Entscheidungsbaum

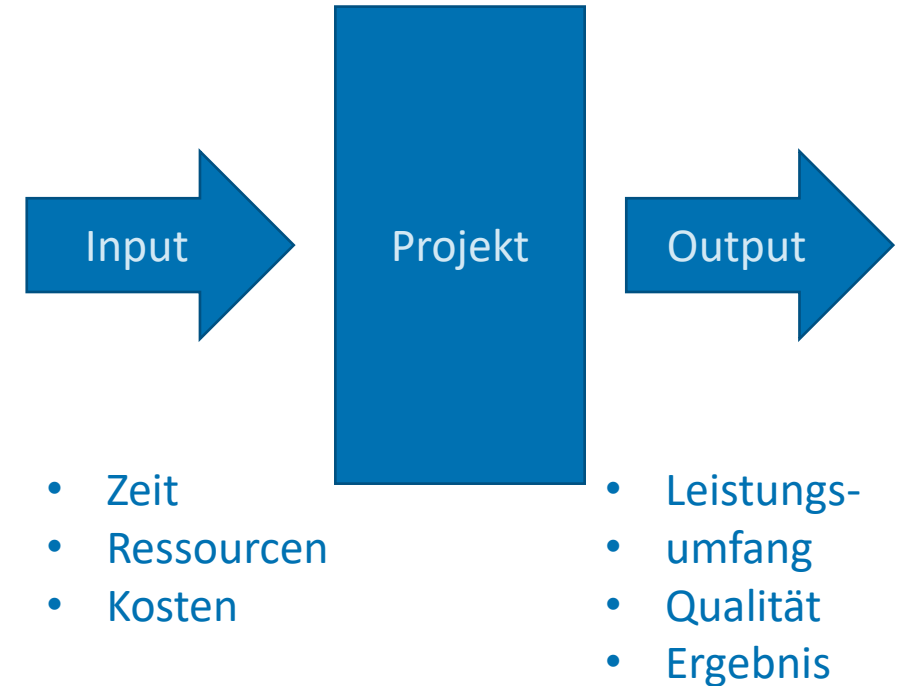

Zur Vertiefung: Zell-Buch (siehe Folie Quellen), S. 39

Nutzwertanalyse

Vergleich von definierten Kriterien

		Variante 1		Variante 2		Variante 3	
Kriterium	Gewicht	Bewertung	Gewichtet	Bewertung	Gewichtet	Bewertung	Gewichtet
Krit 1	25%	1	0,25	2	0,50	1	0,25
Krit 2	50%	2	1,00	4	2,00	6	3,00
Krit 3	15%	3	0,45	5	0,75	2	0,30
Krit 4	10%	4	0,40	3	0,30	6	0,60
	100%		2,10		3,55		4,15

*Gewinner nach
Schulnotenprinzip*

*Gewinner nach
inversem
Schulnotenprinzip*

Klare Ziele!



Zieldefinition – SMART

Klar und konkret

- Mit der sauberen Zieldefinition steht und fällt der Projekterfolg. Diesem essentiellen Schritt muss in der Initiierungsphase von Projekten und im weiteren Verlauf höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden.
- **Bitte beachten:** Immer angeben auf welche Erklärung der SMART-Definition Bezug genommen wird (englische Erklärung oder A für Akzeptiert oder A für Attraktiv)

Zur Vertiefung: Zell-Buch (siehe Folie Quellen), S. 14

Zielsetzung	Erklärung	Fragen
S	Spezifisch	Was mache ich im Detail dafür? Was bedeutet das konkret?
M	Messbar	Welche Kennzahlen anwenden? (Gewicht, Alter, Entfernung, Anzahl, Stück, Prozente)
A	Attraktiv	Was ist der Mehrwert? Warum setze ich das Projekt um? Was für einen positiven Unterschied macht das?
R	Realisierbar	Welches Wissen ist vorhanden? Habe ich die benötigten Ressourcen?
T	Terminiert	Zu welchem Zeitpunkt soll das erledigt sein? Wie lange habe ich dafür Zeit


Analyse und Auswertung



Stakeholder-Analyse

Am Projekt interessiert, vom Projekt betroffen, Einfluss auf Projekterfolg

- **Definition:** Stakeholder sind alle am Projekt beteiligten Personen, die dieses beeinflussen oder von dem Projekt beeinflusst werden.
- Stakeholder-Analyse in 5 Phasen

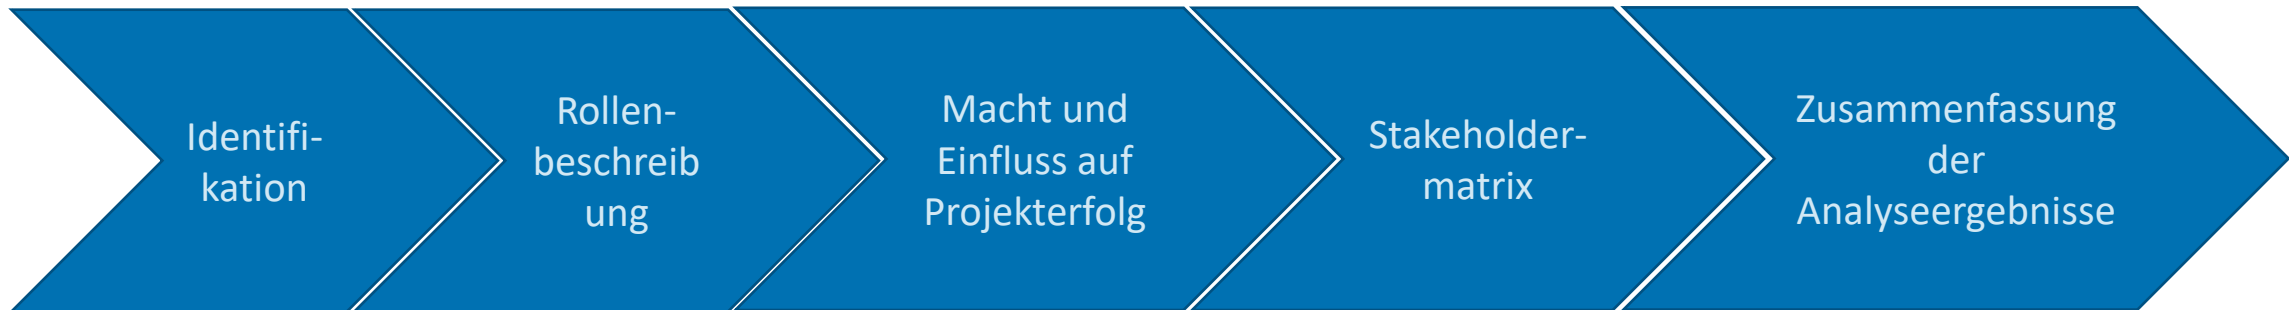

Zur Vertiefung: Zell-Buch (siehe Folie Quellen), S. 39

Risikoanalyse

Was kann denn alles schief gehen?

- Gefahren erkennen und benennen
- Kategorisierung und Wichtung
- Was kann ich akzeptieren, verhindern, reduzieren...?
- Lösungsansätze entwickeln



Zur Vertiefung: Zell-Buch (siehe Folie Quellen), S. 43

Risikomatrix

Prinzipieller Aufbau

Risikomatrix					
Zu erwartender Schaden	hoch sehr hoch				
	hoch				
	mittel				
	gering				
	sehr gering				
		keine	nicht wahr-scheinlich	möglich	wahr-scheinlich
		Eintrittswahrscheinlichkeit			

Projektkommunikation

Wer soll wie, wie oft und in welcher Form Informationen erhalten?

- Beachtung der bereits erfolgten Analysen
- Vereinbarung
 - über Art der Kommunikation
 - Häufigkeit
 - Reaktionszeiten
- Projektleiter koordiniert
- interne und externe Kommunikation
- 1. Planung von Dokumentationen



Zur Vertiefung: Zell-Buch (siehe Folie Quellen), S. 47


Grobplanung und Go!



Das Pflichtenheft

Umsetzung geplant und grob skizziert

- Ersteller: **Auftragnehmer**
- Laut **DIN 69901-5** umfasst das Pflichtenheft die „vom Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts“. Die Anforderungen des zuvor ausgearbeiteten Lastenhefts sind nun mit technischen Festlegungen der Betriebs- und Wartungsumgebung verknüpft. ^[1]

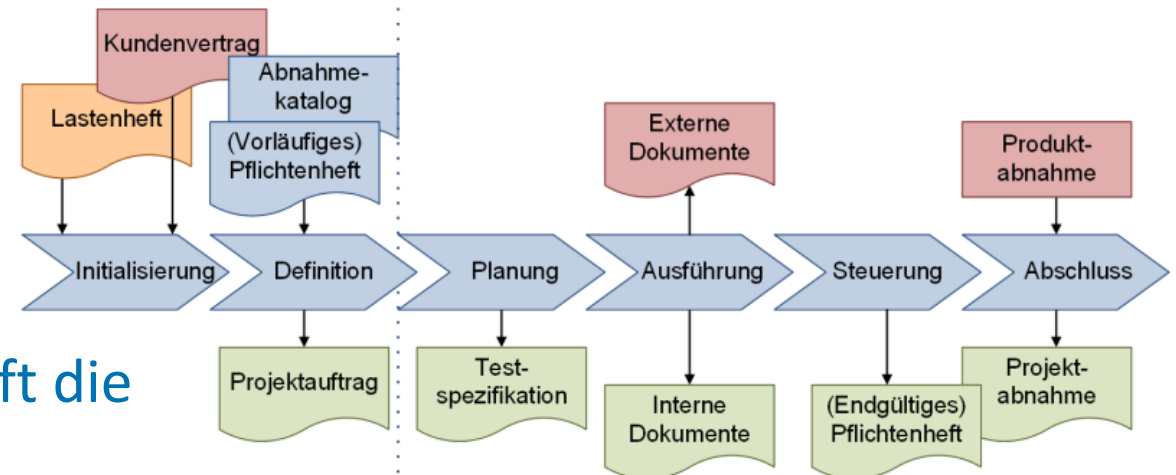

<https://de.wikipedia.org/wiki/Pflichtenheft>

Kickoff-Meeting

Jetzt geht's los!

- Kennenlernen
- Klärung von Erwartungen, Fragen und Informationsbedürfnissen
- Ausgangslage
- Projektziele
- Projektorganisation
- Projektplanung

Zur Vertiefung: Zell-Buch (siehe Folie Quellen), S. 51



Projektantrag & -auftrag

Projektvertrag

- Zieldefiniton
- Erfassung der wichtigsten Projektbeteiligten
- Zuständigkeiten und Verantwortungsbereich des Projektleiters
- Grobplanung und –kalkulation
- Zusammenfassung Ergebnisse Risikoanalyse und Lösungsansätze
- Schriftliche Bestätigung durch die Auftraggeber und –nehmer (Vertragsgegenstand)

Projektauftrag Projekt:	
Projektleiter:	
Aufgabenstellung:	
Zu erarbeitende Ergebnisse:	
Kosten / Budget:	
Termine: Start:	Ende:
Rahmenbedingungen:	
Auftraggeber	Projektleiter

Quellen

Buchquelle

¹ Zell, Helmut (2018) : Projektmanagement. Lernen, lehren und für die Praxis, Books on Demand Norderstedt.

Abbildungen

Folie 1 Adobe Stock | Datei 109348002

Folie 26 Adobe Stock | Datei 308342392 lizenziert

Sonstige Folien Darstellungen innerhalb von PowerPoint erstellt

VIELEN DANK!

