



Projektmanagement



Projektplanung

- Methoden der Terminplanung
- Vorgangsliste, Projektablaufplan
- Balkendiagramm / Gantt - Diagramm

Methoden der Terminplanung

- Vorgangsliste
- Projektablaufplan oder Balken-/Gantt-Diagramm
- Netzplantechniken
- PERT (Program Evaluation and Review Technique)
 - Wenn keine Erfahrungswerte für den Zeitaufwand vorliegen werden, kann mit der
 - PERT Technik dieser Aufwand abgeschätzt werden
- CPM (Critical Path Method)
 - Wenn der Zeitbedarf bekannt ist wird diese Methode angewandt
- MPM (Metra-Potential-Method)
 - Arbeitet ebenfalls mit dem bekannten Zeitbedarf, auch mit dem kritischen Pfad und ermöglicht z.B. Zyklen (1958 von der Firma Metra entwickelt)

Vorgangsliste, Projektablaufplan

- Aufgabe ist es, eine zeitliche Komponente hinzuzufügen
- Der Ablaufplan wird als Balkendiagramm oder Netzplan dargestellt
- Arbeitspakete werden um zwei Aspekte ergänzt:
- Logische Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen werden ermittelt (welches Paket muss abgeschlossen sein, um mit dem nächsten beginnen zu können)
- Dauer wird ermittelt, die als Grundlage der Terminplanung dient

Vorgangsliste

Nr.	Vorgang	Dauer	Vorgänger
1	Netzplan (Aufstellung)	4 h	-
2	Material ermitteln	2 h	1
3	Auftrag Elektriker	1 h	1
4	Material beschaffen	4 h	2
5	Raum ausräumen	1 h	1
6	Kabel verlegen	3 h	3,5,4
7	Serverschrank aufstellen	1 h	3,5,4
8	Switch und Patchfeld installieren	3 h	7,6
9	Geräte aufstellen	2 h	11
10	Software installieren u. Rechner konf.	8 h	9
11	Raum einräumen	1 h	8
12	Einbinden ins Schulnetz	1 h	10
13	Testen	3 h	12

Projektablaufplan (PAP) – Gantt-Diagramm

- Stellt die zeitliche Ablauffolge in Form eines Balkendiagramms dar
- Ergänzung des Projektstrukturplans
- zeitliche Anordnung erfolgt nach Starttermin, Dauer und Ende
- die Kalenderansicht erleichtert die Terminkontrolle
- einfache, anschauliche Form des Ablaufs
- auch als vernetztes Balkendiagramm (Nutzung von Pfeilen) möglich
- Anwendungssoftware: MS Project / open Project

Darstellung als Balkendiagramm

Senkrechte Achse


- Die einzelnen Arbeitspakete werden untereinander eingetragen

Horizontale Achse

- Ist die Zeitachse
- Die Länge der Balken drückt die Dauer der einzelnen Vorgänge (Arbeitspakete) aus
- Mit Pfeilen lassen sich Abhängigkeiten zwischen Vorgängen darstellen
- Die Termine der Meilensteine können ebenfalls eingetragen werden (üblicherweise als Raute)


Gantt-Diagramm

Pfeile zeigen Abhängigkeiten, zusätzliche Informationen wie Puffer, Meilensteine oder Dauer möglich

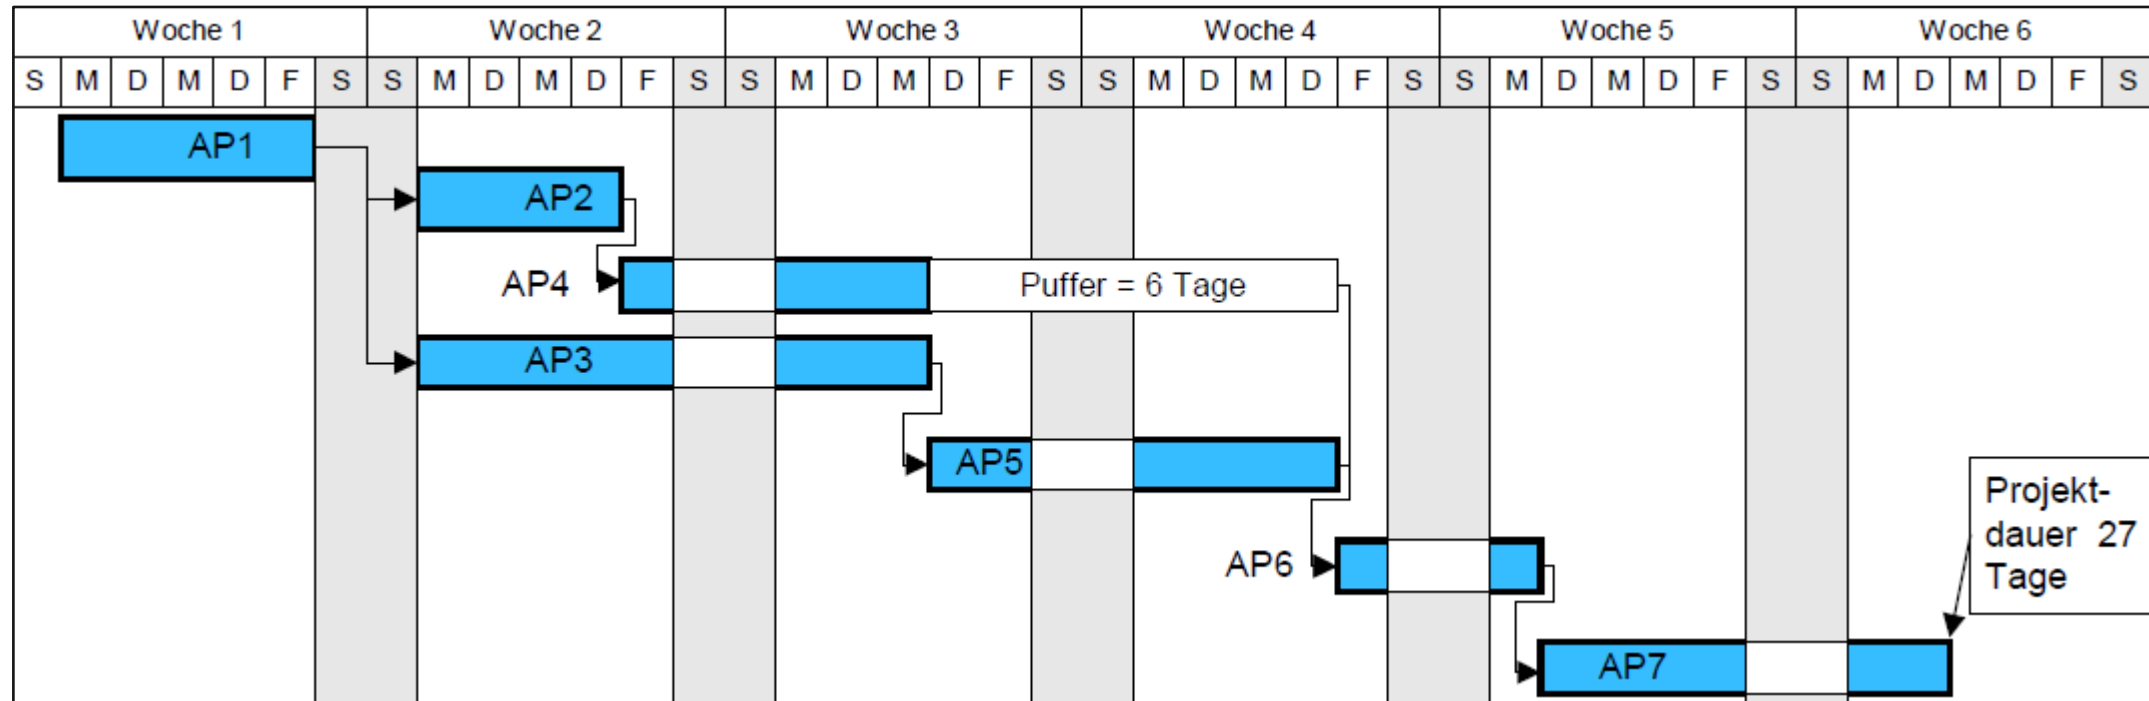

Gantt-Diagramm

Einfache Form – wie bei IHK Prüfungen

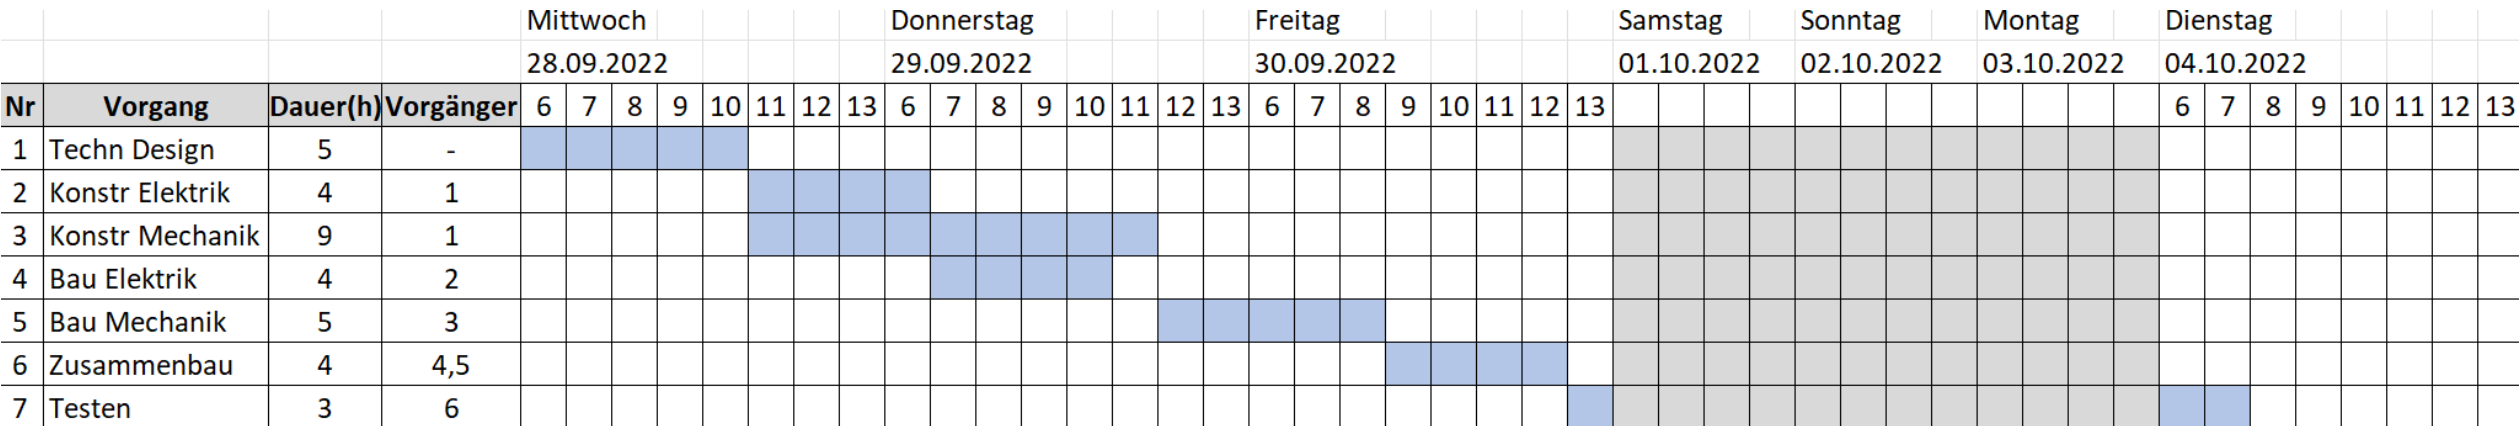

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

