



Projektmanagement



Projektdurchführung

- Kick Off Meeting
- Kommunikation
- Teambuilding

Kickoff-Meeting

„Nach erfolgter Projektplanung und vor dem Start der
eigentlichen Durchführung“ (DIN 69901-5)

- Kennenlernen
- Motivationsschub
- Begeisterung für das Projekt wecken
- Vorstellung von:
 - Ausgangslage
 - Projektziele
 - Projektorganisation
 - Projektplanung



Aufgaben des Projektmanagements in der Durchführungsphase

Zusammenspiel von Projektsteuerung, -controlling und – Dokumentation

- Projektsteuerung = zielgerichtete Lenkung aller Tätigkeiten im Rahmen eines Projektes zur rechtzeitigen Fertigstellung
- Projektcontrolling = hat die Aufgabe, Abweichungen der Projektdurchführung von der Projektplanung zu entdecken und die Projektsteuerung bei der Korrektur zu unterstützen
- Projektdokumentation = Versorgt Projektsteuerung bzw. Projektcontrolling mit Informationen

Operative Maßnahmen der Projektsteuerung

Team- und Teamleiterbesprechungen

- Projektleiter führt Besprechungen mit dem Projektteam, Teams der einzelnen Arbeitspakete oder den Verantwortlichen durch
- Sollten regelmäßig stattfinden
- Alle Teilnehmer müssen rechtzeitig über die Tagesordnungspunkte informiert werden

Operative Maßnahmen der Projektsteuerung

Sinn von Team- und Teamleiterbesprechungen

- Verschaffen einer Orientierung über die Projektentwicklung
- Probleme werden angesprochen und Lösungen entwickelt
- Teamleiter entlasten die Projektleitung durch Verantwortungsbewusstsein
- Projektmitarbeiter und Teamleiter identifizieren sich mit dem Gesamtprojekt

Projektkommunikation

Wer soll wie, wie oft und in welcher Form Informationen erhalten?

Vereinbarung

- über Art der Kommunikation
- Häufigkeit
- Reaktionszeiten
- Koordination: Projektleiter
- interne und externe Kommunikation
- Planung der Dokumentation

Kontakt zum Auftraggeber

- Der Auftraggeber zeigt Interesse am Projektverlauf und möchte über bestimmte Entwicklungen informiert werden
- Der Auftraggeber wünscht nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des Projektauftrags. Um zu gewährleisten, dass nachträgliche Änderungswünsche nicht alles durcheinanderbringen, muss das Projektteam Regeln aufstellen, in welcher Weise betroffene Projektmitarbeiter über Änderungen informiert werden und sich die Machbarkeit dieser Änderungen bestätigen lassen.
- Der Auftragnehmer sucht den ständigen Kontakt zum Auftraggeber als vertrauensfördernde Maßnahme (Kundenbetreuung als Marketinginstrument).

Erfolgreiche Meetings

Vorbereitung

- Klärung der Notwendigkeit eines Meetings
- Inhalte und Zielsetzung festlegen
- Zeitrahmen stecken
- Teilnehmer und ggf. Stellvertreter festlegen
- Ablaufplan erstellen
- Erstellung einer Agenda
- Raum und Hilfsmittel festlegen und bestellen
- Teilnehmer einladen und Agenda übermitteln

Erfolgreiche Meetings

Durchführung

- Pünktlich beginnen
- Moderator stellt Zeitplan und Zielsetzung vor und führt in die Themen ein
- Moderator sammelt wichtige Meldungen
- Moderator sorgt für eine Balance der Meldungen
- Moderator sorgt für die Einhaltung der Pausen und Agenda Punkte
- Schriftführer erstellt ein Protokoll
- Meeting pünktlich beenden

Erfolgreiche Meetings

Nachbereitung

- Protokoll den wichtigen Stakeholdern zur Verfügung stellen
- besprochene „to do's“ fixieren und die Umsetzung begleiten/überwachen
- nicht erledigte Agenda Punkte in das nächste Meeting übernehmen

Vier-Seiten-Modell

Sachebene

- welche Informationen werden gesendet?

Selbstoffenbarung


- was gibt der Sender von sich preis?

Beziehungsebene

- was hält der Sender vom Empfänger?


Appell

- was will der Sender vom Empfänger?

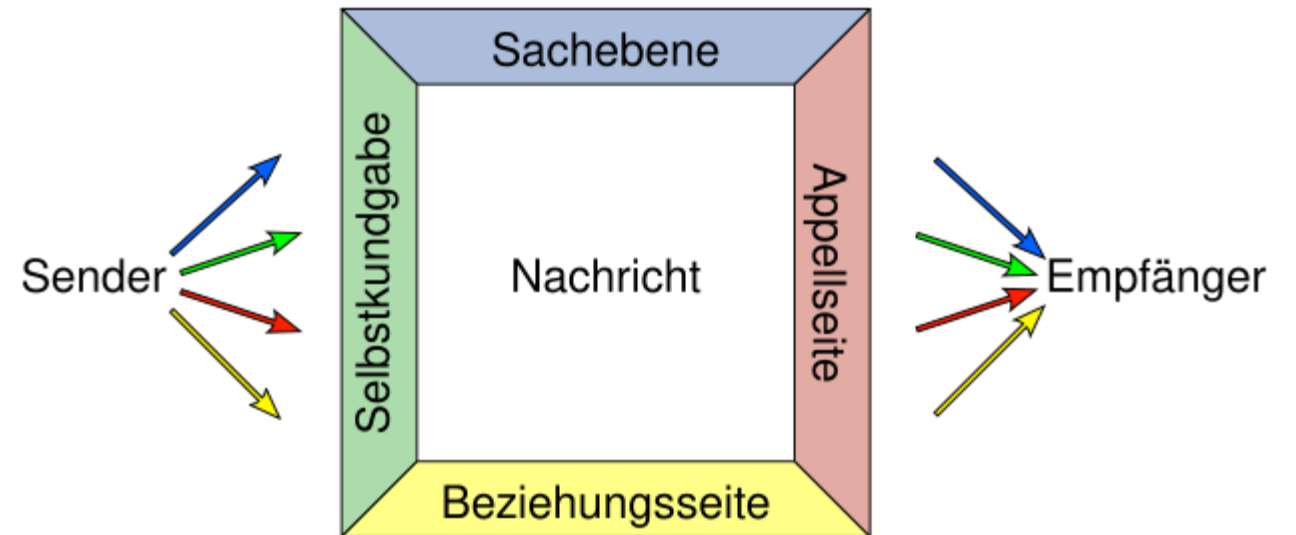

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Modell>

Teamaufbau nach Tuckman

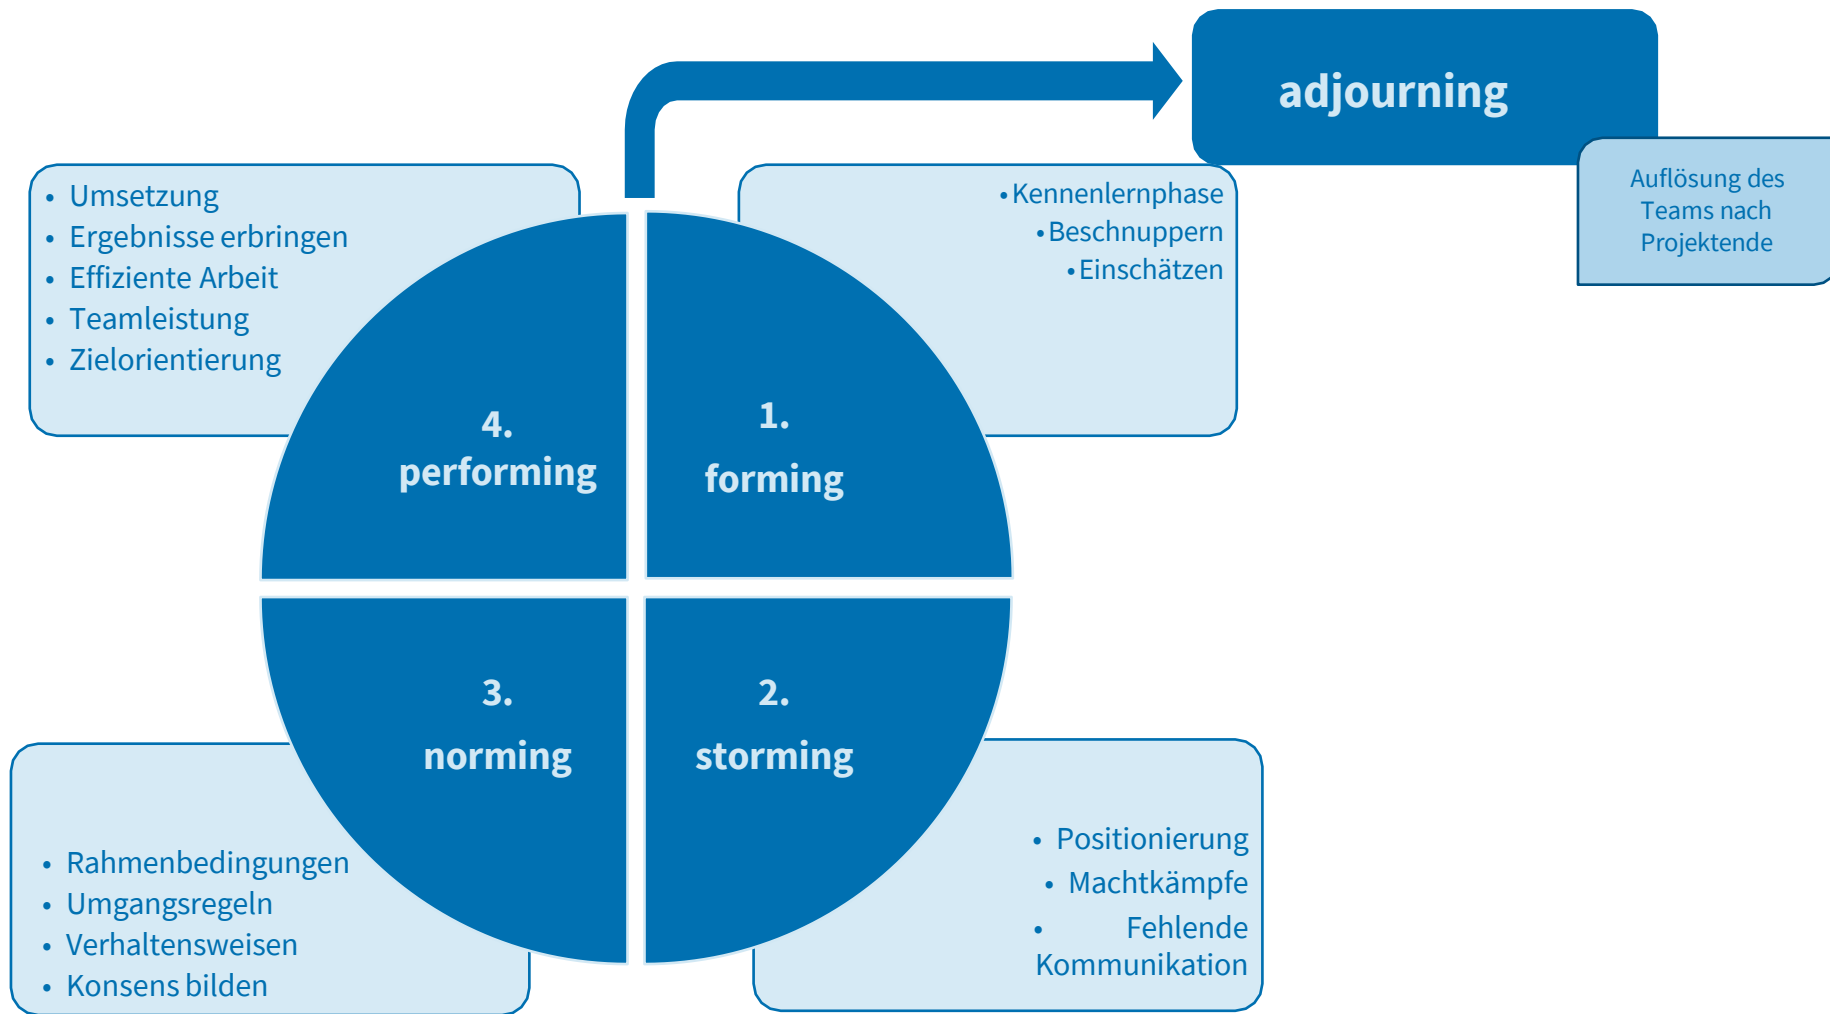

Konflikte sind unvermeidbar

Projekte sind meist durch die

- Neuartigkeit des Vorhabens
- die Gegensätze zum Routinebetrieb
- die schwierigen Rahmenbedingungen
- den damit verbundenen Druck für Veränderungen

gekennzeichnet.

Daher gibt es viele Reibungsflächen und Konflikte sind in Projekten unvermeidbar.

Konflikte sind nicht nur negativ

Wir empfinden Konflikte meist als Störungen und sehen sie negativ.

Es kann aber auch Vorteile durch Konflikte geben


- Konflikte können neue Energien freisetzen und neue Ideen anregen
- Konflikte können zum Abbau von Spannungen führen
- Konflikte ermöglichen Wandel. Sie führen zu Veränderungen und Entwicklungen
- Konflikte können die Gruppenbindung erhöhen wenn Abweichler wieder "auf Kurs" gebracht werden

Konfliktmanagement

- In Projekten gehören Konflikte zum Alltag
- Gelebtes Konfliktmanagement ist eines der wichtigsten Tools im Projektmanagement
- Konflikte sollten möglichst im Vorfeld vermieden werden
- Konflikte lassen sich aber selbst mit dem besten Management nicht vermeiden
- Konflikte sollten in einer konstruktiven Konfliktkultur des Miteinanders statt des Gegeneinanders gelöst werden

Konflikte sind unvermeidbar

Neun Stufen der Konflikt-Eskalation nach Friedrich Glasl

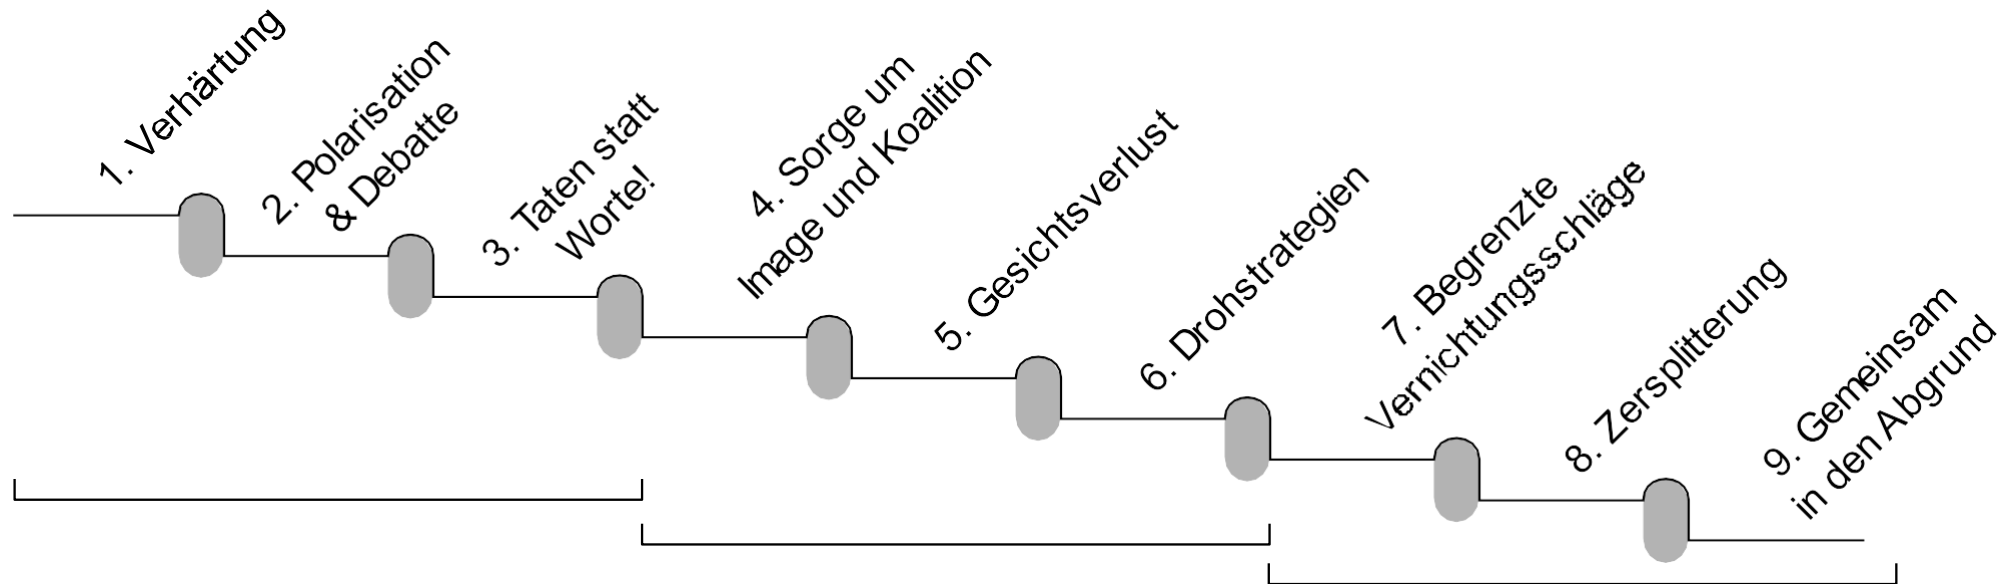

Von Benutzer: Sampi - Quelle: Glasl, 1994, S. 216, 218-219, CC BY-SA 2.0 de, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45956514>

9 Stufen der Eskalation (nach Glasl)

- Man kann Konflikte in neun unterschiedliche Eskalationsstufen einteilen
- Jede weitere Stufe geht mit einem Verlust an Selbstbeherrschung einher
- Ziel ist:
- Den Konflikt frühzeitig aufzulösen

9 Stufen der Eskalation (nach Glasl) – Phase 1

- Erste Hauptphase
 - Verhärtung
 - Polarisierung und Debatte
 - Taten statt Worte
- Lösung noch auf sachlicher Ebene möglich.
- Win – Win

9 Stufen der Eskalation (nach Glasl) – Phase 2

- Zweite Hauptphase
 - Sorge um Image
 - Gesichtsverlust
 - Drohstrategien
- Eine Partei zieht den Kürzeren.
- Win – Lose

9 Stufen der Eskalation (nach Glasl) – Phase 3

- Dritte Hauptphase
 - Begrenzte Vernichtungsschläge
 - Zersplitterung
 - Gemeinsam in den Abgrund
- Die Situation kennt nur noch Verlierer.
- Lose - Lose

Harvard Methode

- Die Harvard Methode ist eine Verhandlungstechnik
- Sie dient zur Einigung in Konfliktsituationen
- Ziel ist eine Win-Win Situation
- Es soll eine konfliktfreie und friedliche Einigung erzielt werden
- Menschen und Probleme werden voneinander getrennt
- **Interessen** und nicht **Positionen** sollen verhandelt werden

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

