



Projektmanagement



Projektdurchführung

- Durchführungsphase - auch Steuerungsphase genannt
- Projektcontrolling
- Termin / Kosten / Leistungskontrolle
- Abweichungen

Projektcontrolling und -steuerung


Projektcontrolling

Was ist das?

DIN 69901:

- „Sicherung des Erreichens der Projektziele durch: Soll-Ist-Vergleich, Feststellung der Abweichungen, Bewerten der Konsequenzen und Vorschlagen von Korrekturmaßnahmen, Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung und Kontrolle der Durchführung“.

Kontrolle und Steuerung

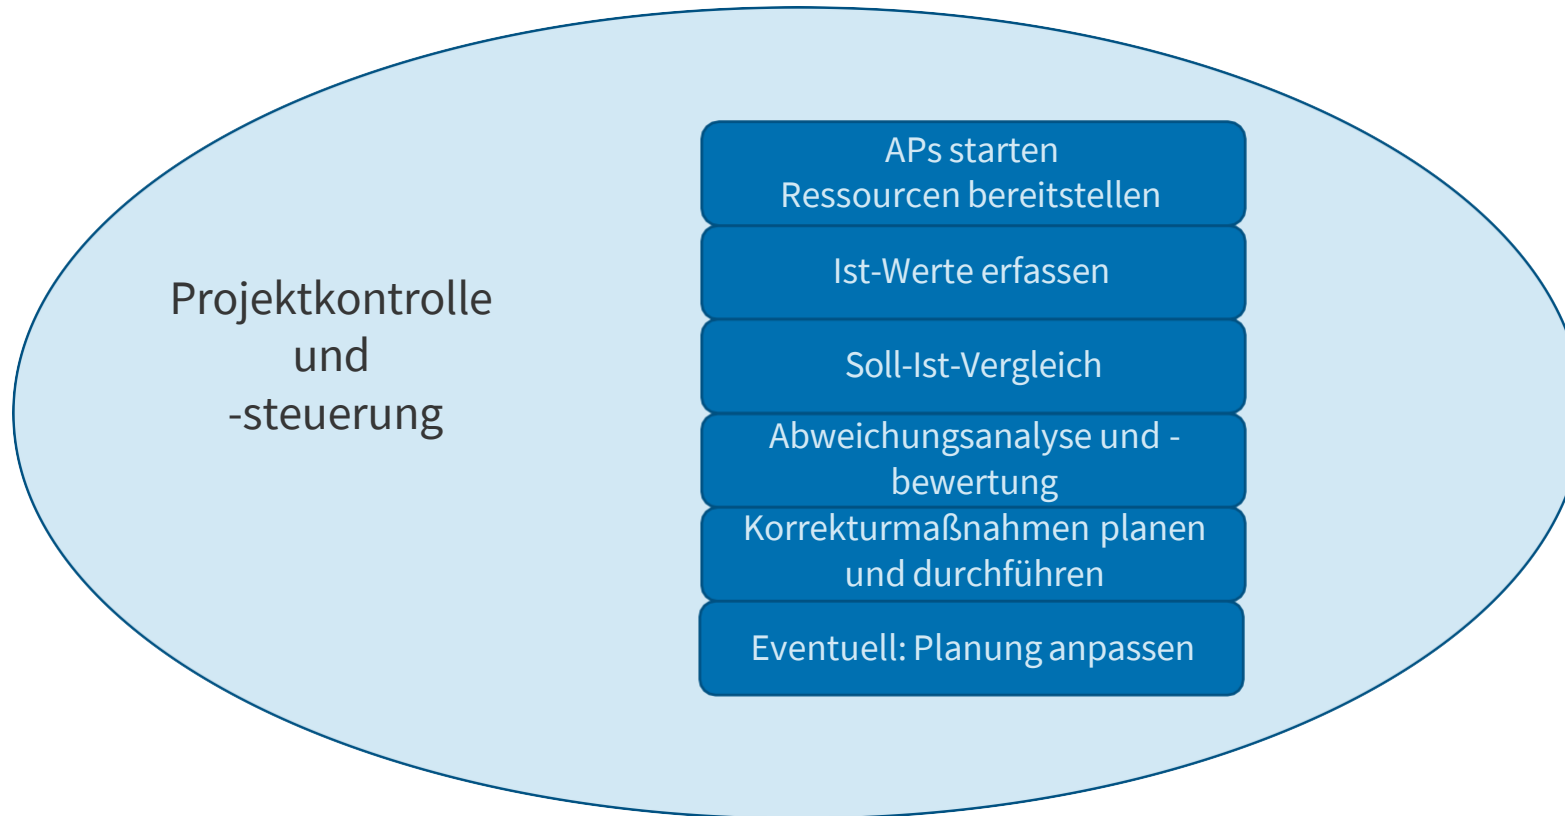

Zuständigkeit klären

- Projektleiter?
- Projektteam?
- externes Controlling?

Zeitpunkt für Abfragen

- in Intervallen?
- an Meilensteinen?
- Kombination aus beidem

Klärung von Rahmenbedingungen

Erfolgreiches Projektcontrolling braucht klare Regeln

- Was ist zu überwachen?
- Wer ist zuständig?
- Wie und in welcher Form erfolgen die Rückmeldungen?
- Hol- oder Bringschuld der Kontrollwerte?
- Welche Kennzahlen für die Ist-Erfassung nutzen?
- Strukturierung der Aufgaben in Form eines PSP bereits in der Planungsphase

Holschuld


*Notwendige
Informationen besorgen
durch das Management*

Bringschuld

*Lieferung der Kennzahlen
durch den
Aufgabenverantwortlichen*


Magisches Dreieck – Planung und Realisierung

Soll- / Ist-Vergleich

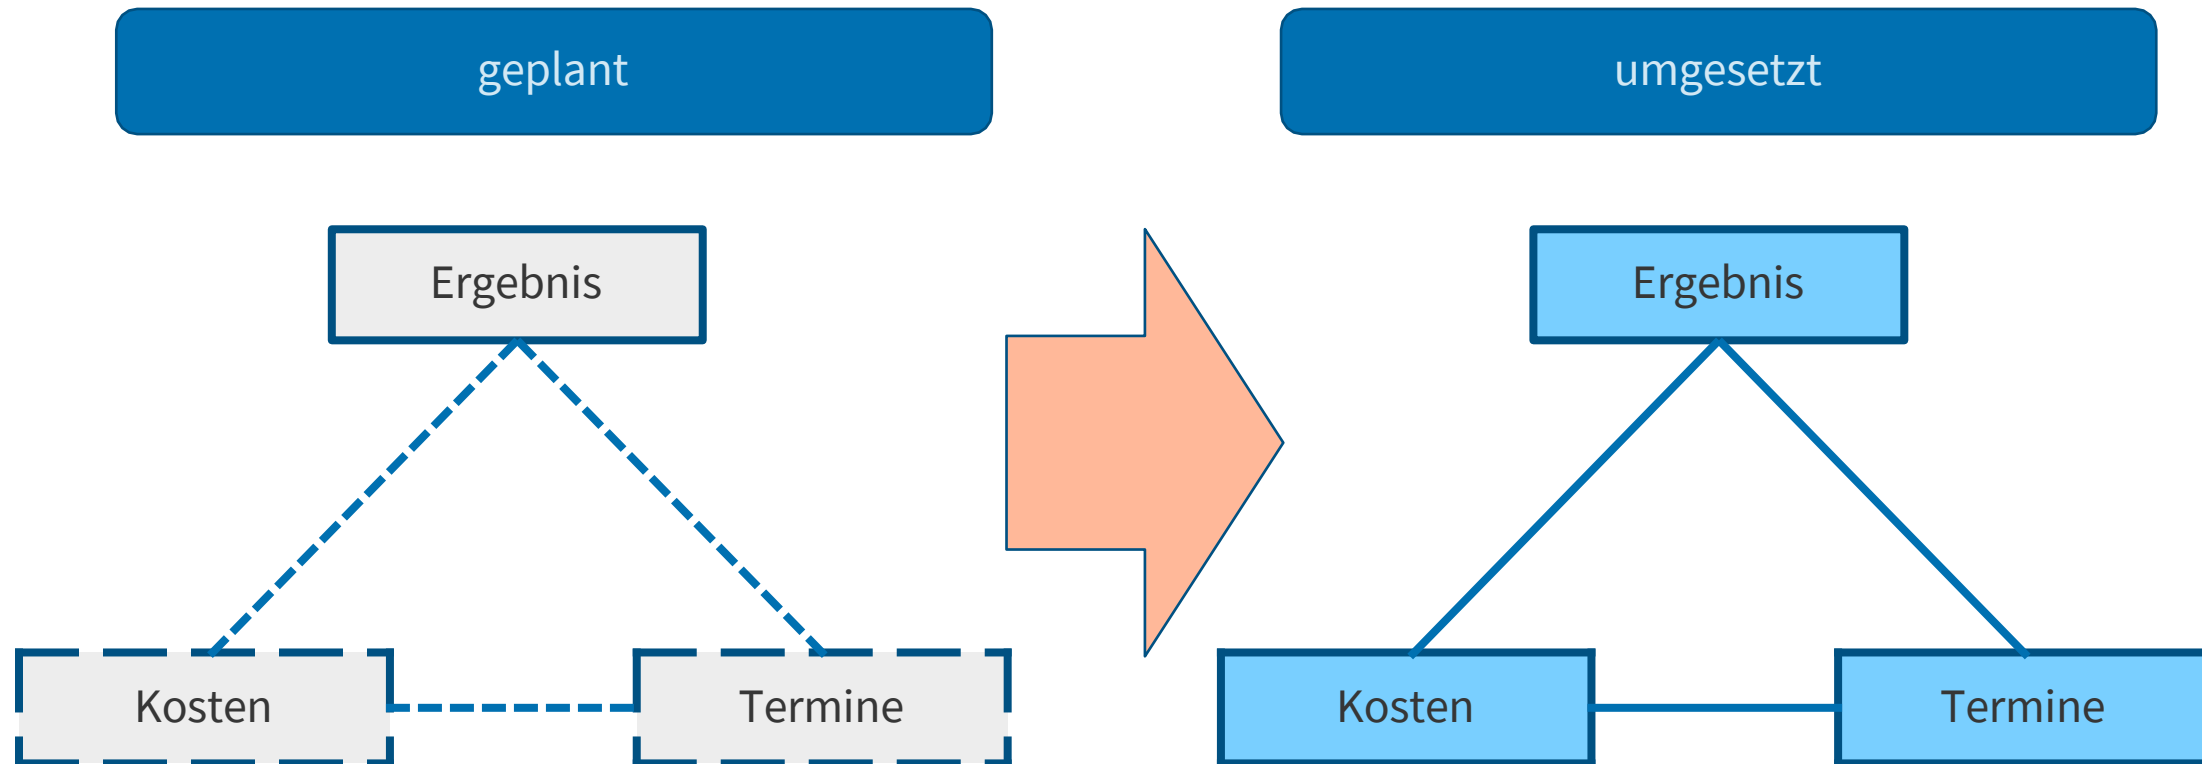


Projektsteuerungszyklus

Einwirkungen während der Projektdurchführung

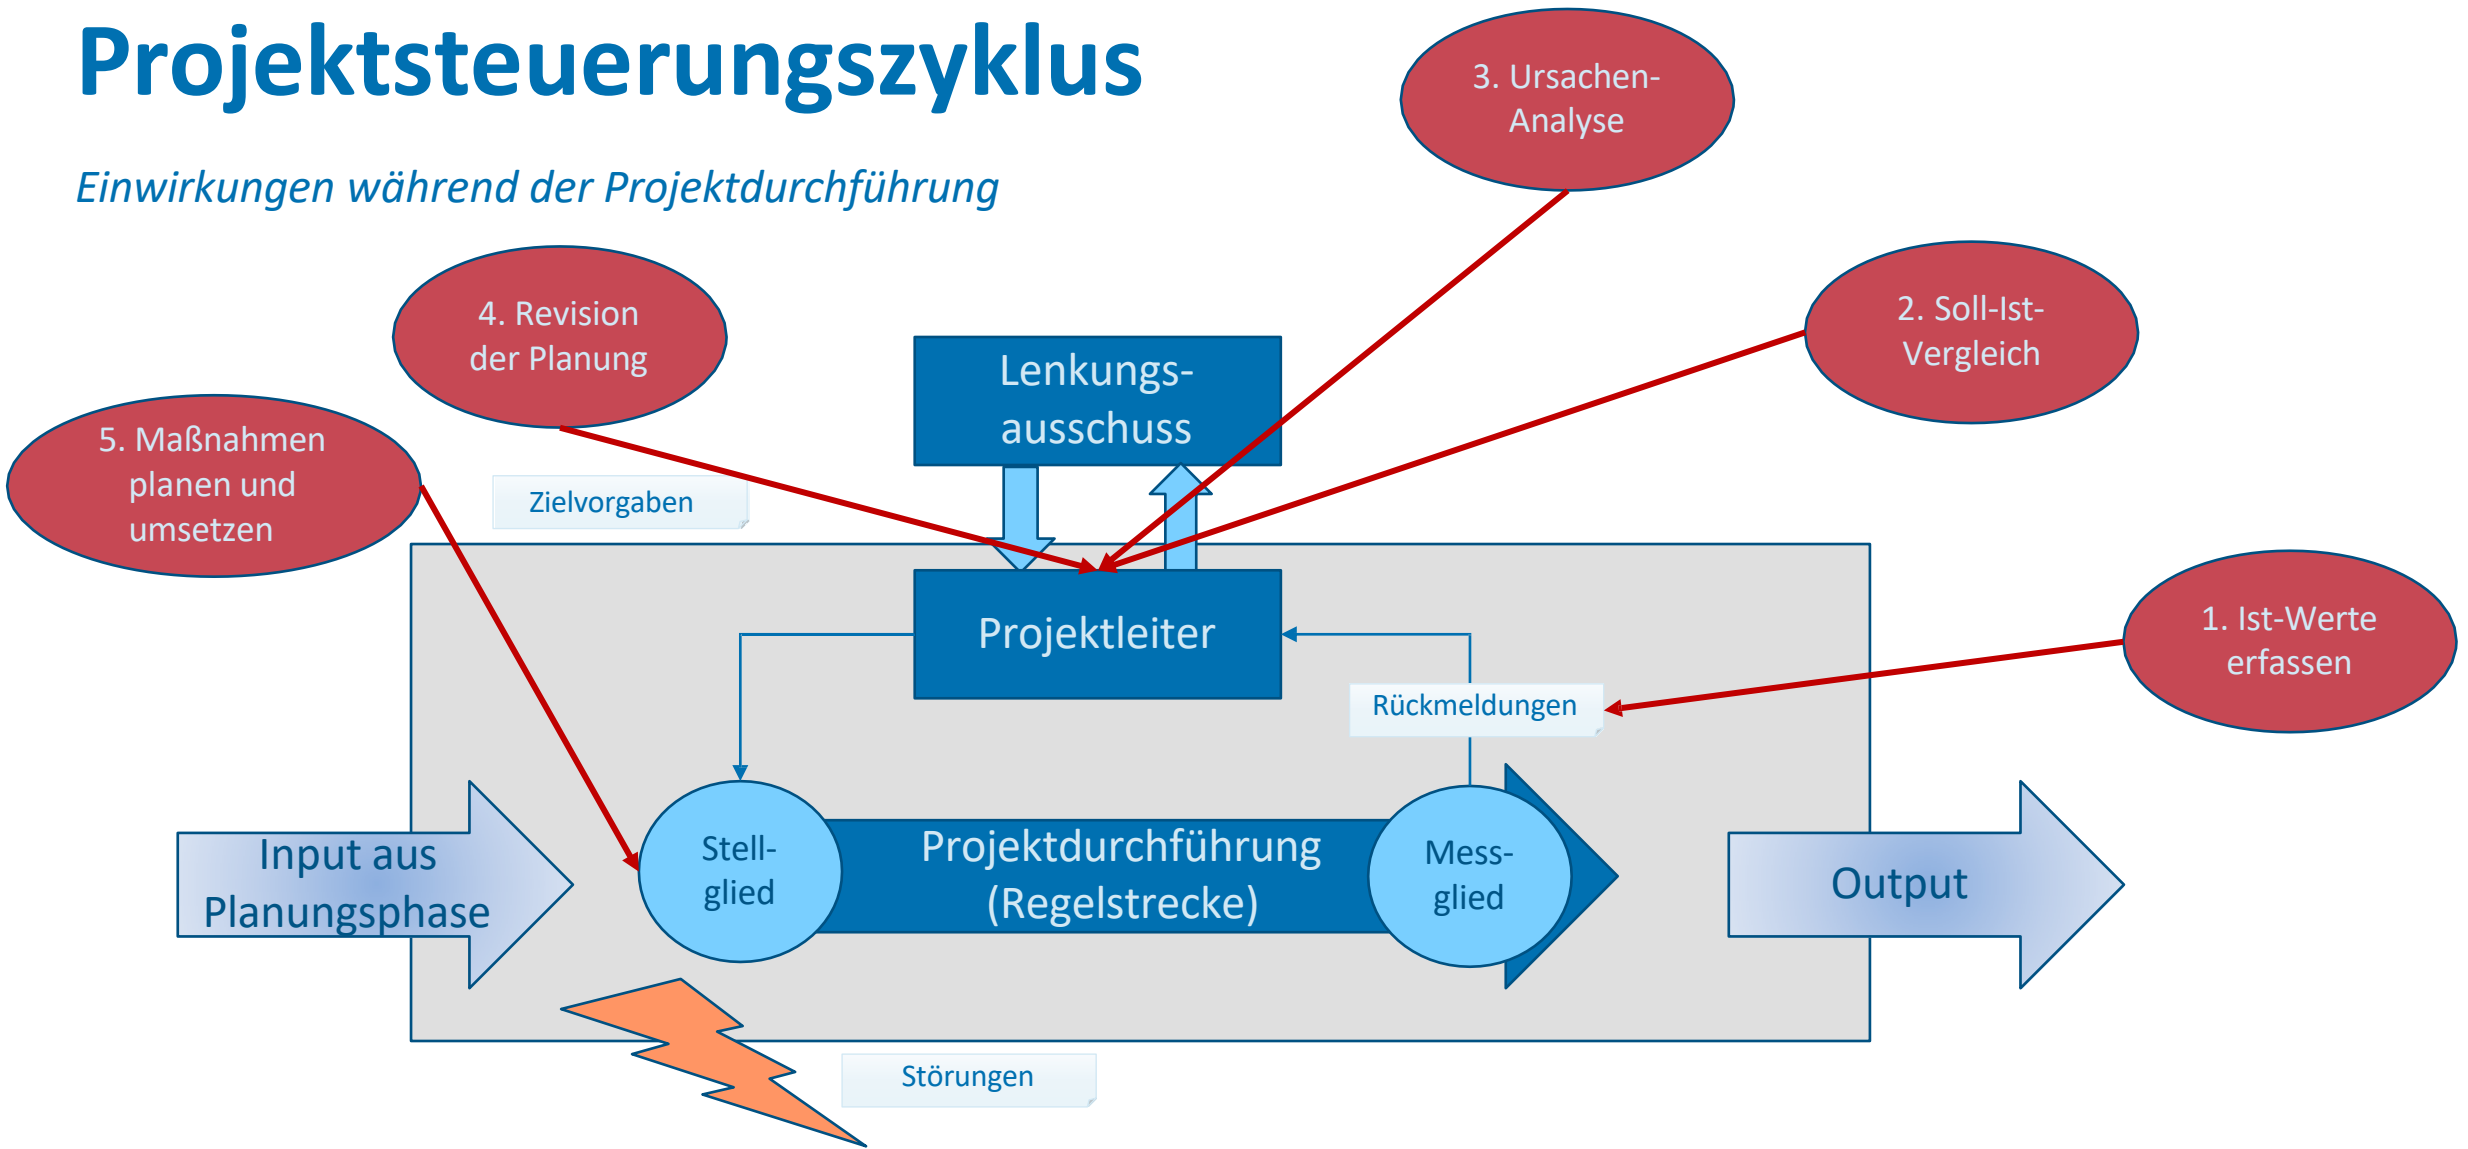

Controlling-Prozess

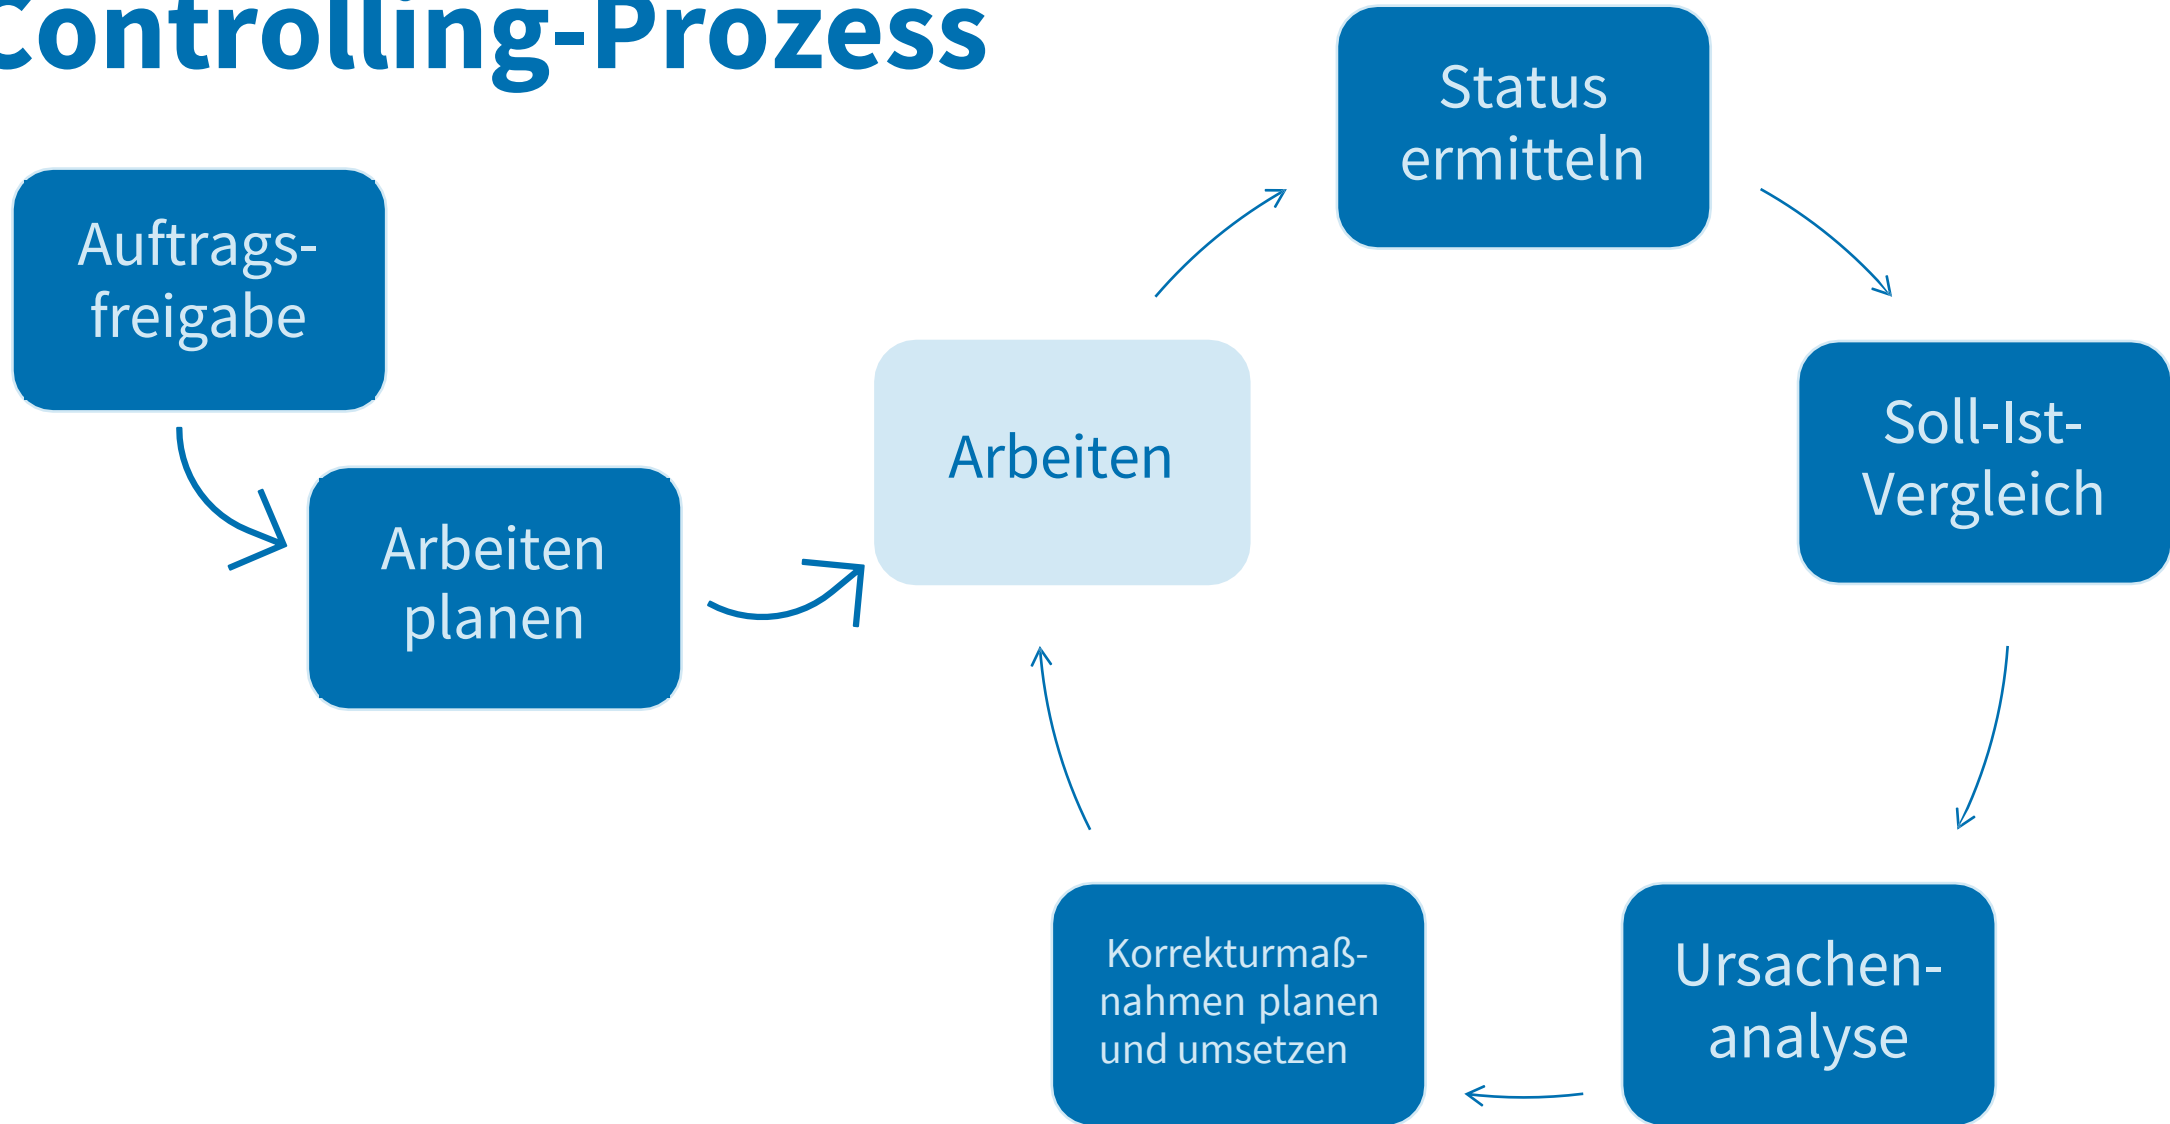

ISO Normen und kleine Geschichte

- Qualität wird durch den Chef bestimmt
- ISO 9000 - Qualitätsmanagement – der Markt regelt die Qualität, der Qualitätsmanager überwacht diese
- ISO 9001 - Jeder ist für Qualität verantwortlich – alle Mitarbeiter kennen den Qualitätsbegriff der Firma und gestalten diesen mit
- ISO 9004 - (Empfehlung, keine Norm) Total Quality Management (TQM), das sowohl die Führungsebene als auch die Mitarbeiter in allen Bereichen der Organisation einbezieht. Es stellt ein permanentes Lernen und Verbessern in den Mittelpunkt und ist auf die Kundenzufriedenheit ausgerichtet

Lasst uns über Qualität sprechen

PDCA

- Plan
 - Planen was zu tun ist
- Do
 - Umsetzen des Plans zuerst **nur in einem Teil des Unternehmens**
- Check
 - Hat der Plan funktioniert?
- Act
 - War alles erfolgreich wird dieser Plan und die Umsetzung **aufs ganze Unternehmen übertragen**



Die 4 Phasen des PDCA-Zyklus
Quelle: Kudernatsch, München

Soll-Ist-Vergleich, Kosten-, Termin- und Leistungskontrolle


Terminkontrolle

Darstellungsmöglichkeiten

- **Gantt-Diagramme:** Vorlage mit Planzeit, jeweils Einfügen von Zeile mit der realisierten Zeit
- **Meilenstein-Trendanalyse:** regelmäßige Abfrage bei den Verantwortlichen im Verlauf, wann die Meilensteine erreicht werden können
- Ziel: Zeit im Blick behalten

Kostenkontrolle

- Personalkosten
- Materialkosten
- Betriebsmittelkosten
- Sonstige Kosten

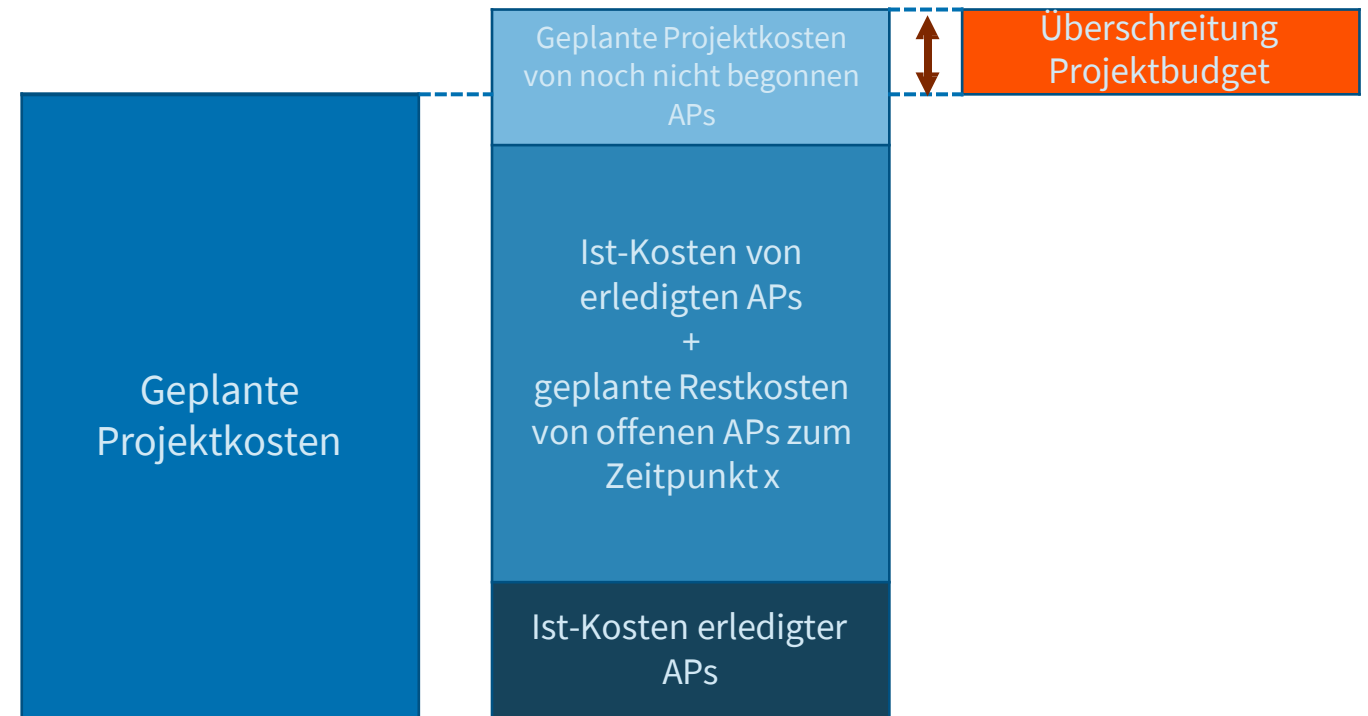

Leistungskontrolle

- Leistungsfortschritt messen und beurteilen
- Ertragswertanalyse (Earned-Value-Analyse)
- Fertigstellungsgrad: zum Stichpunkt erbrachte Leistung
- Fertigstellungswert: erbrachte Sach- und Dienstleistungen

Meilenstein-Trendanalyse


Für eine Meilenstein-Trendanalyse (MTA) sind eindeutige Meilensteine mit festen Terminen notwendig.

Bei möglichst regelmäßig stattfindenden Besprechungen werden Informationen zum Status der Meilensteine gesammelt.


Zeitliche Verschiebungen werden in der MTA eingetragen.

Die MTA sollte in den Projektabschlussbericht.
Für "Lessons Learned" ist die MTA besonders gut geeignet.

Beispiel: Meilenstein-Trend-Analyse

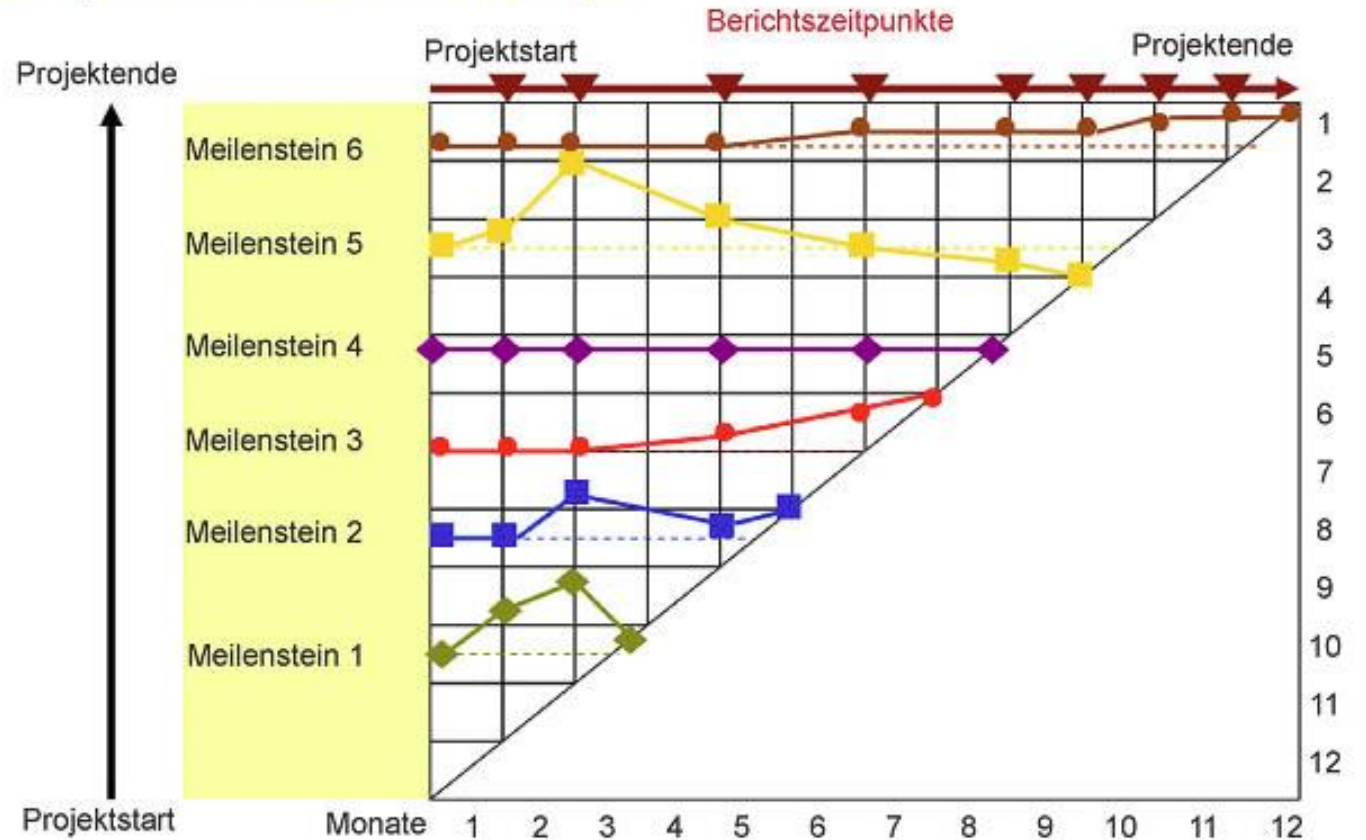

Meilensteine im Controlling

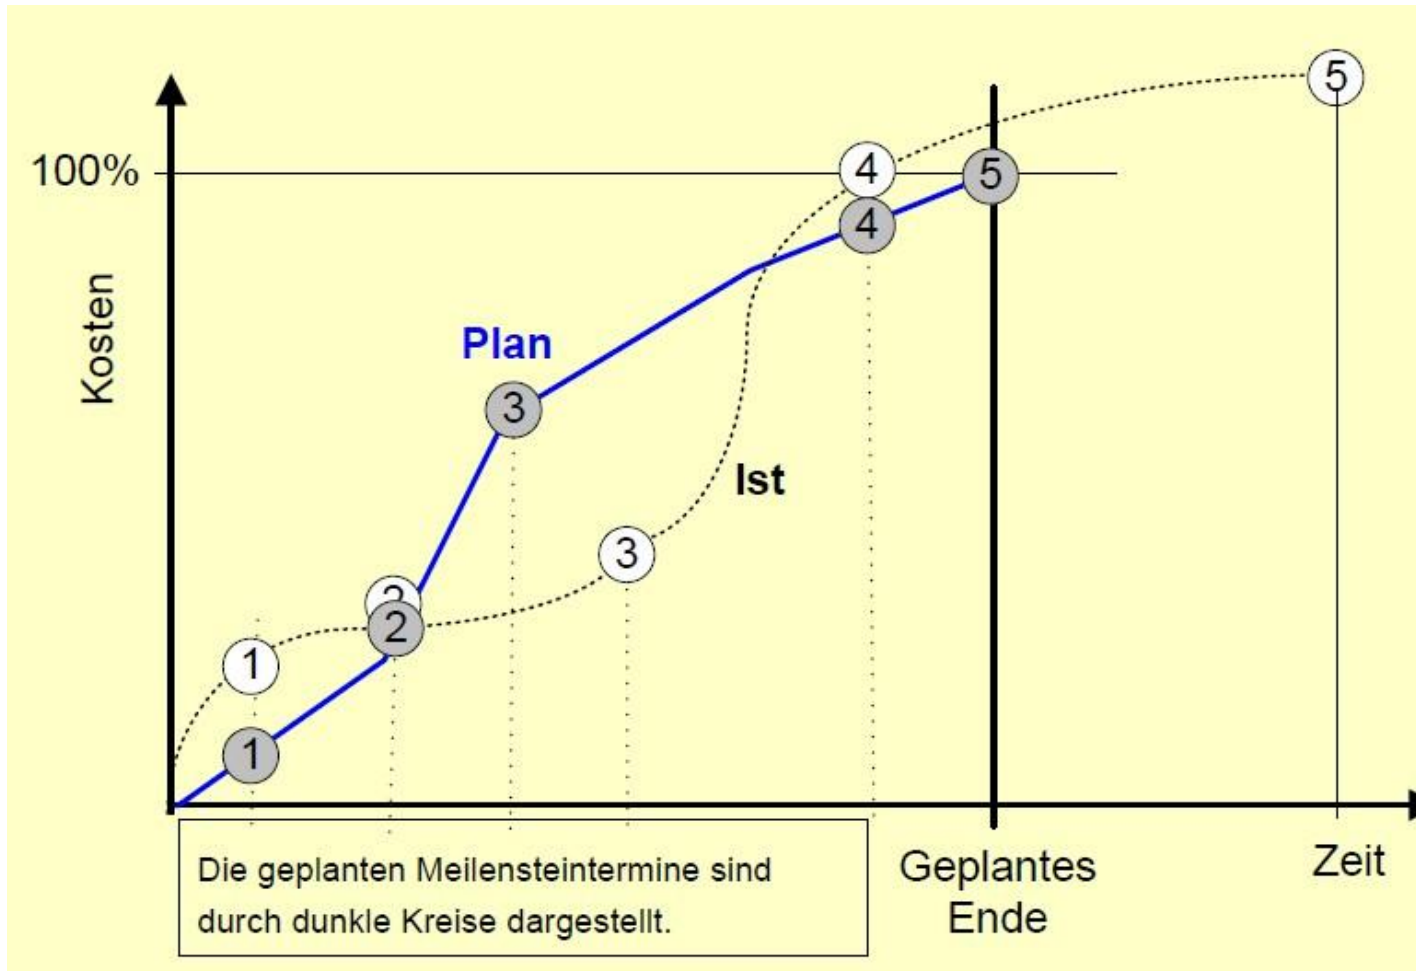

- **Meilenstein 1:** Termin eingehalten, aber Kostenüberschreitung.
- **Meilenstein 2:** Termin als auch die Kosten eingehalten. Das Projekt ist exakt auf Kurs.
- **Meilenstein 3:** verspätet, aber Kosten sind niedriger als geplant.
- **Meilenstein 4:** Termin wird eingehalten, Kosten höher als geplant.
- **Meilenstein 5:** erst mit erheblicher Verzögerung erreicht. Gesamtkosten zu hoch.

Abweichungen und Maßnahmen für den Projekterfolg

Ursachen für Abweichungen

- Änderung von Planzielen – Erkennen, dass geplante Ziele nicht optimal waren
- Planziele passen, aber während Durchführung nachweisliche Abweichungen vom Plan
- falsche Kalkulation von Ressourcen

Planungsfehler

Ausführungsfehler

Änderung
Rahmenbedingungen

Korrekturmaßnahmen

Problemlösungsansätze

- **Reaktiv:**
- unerwünschte Soll-Ist-Abweichungen durch Änderung in der Aufgabenbearbeitung kompensieren
- **Proaktiv:**
- Schwierigkeit erkennen
- Anpassung während der Durchführung
- in Umsetzung einfließen lassen

Überstunden

mehr Betriebsmittel

Arbeitspakete outsourcen

zusätzliche Ressourcen

Reduzierung des
Projektumfangs

Terminverschiebung

Korrektur bei Planabweichungen

Kann durch verschiedene Gründe entstehen:

- Fehlplanung (aufgrund falscher Einschätzungen oder Denkfehler)
- Verzögerungen bei der Durchführung einzelner Arbeitspakete
- Nachgeschobene Änderungswünsche des Projektauftrags durch den Auftraggeber evtl. verbunden mit einer formalen Vertragsänderung
- Unvorhergesehene Ereignisse (z.B. Krankheit eines Mitarbeiters)

Durch den Projektfortschritt wird der Informationsstand ständig verbessert

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

